


◆ 事業概要

1. 概要

1) 全体の概要


- ・ 境川は、相模原市緑区の城山湖付近にその源を発し、東京都と神奈川県の間境を南下して町田市南端から神奈川県に入り、柏尾川などの支川を合わせて相模湾に注ぐ、延長52.1 km、流域面積210.7 km<sup>2</sup>の二級河川である。
- ・ 本河川の流域は、東京都の町田市、神奈川県の間境、相模原市、大和市、横浜市、藤沢市、鎌倉市の6市である。
- ・ 本河川の流域内には、JR横浜線、相模線、京王相模原線、国道、県道等の交通網が発達している。また、国道16号は災害時の緊急交通路指定想定路として位置づけられている。

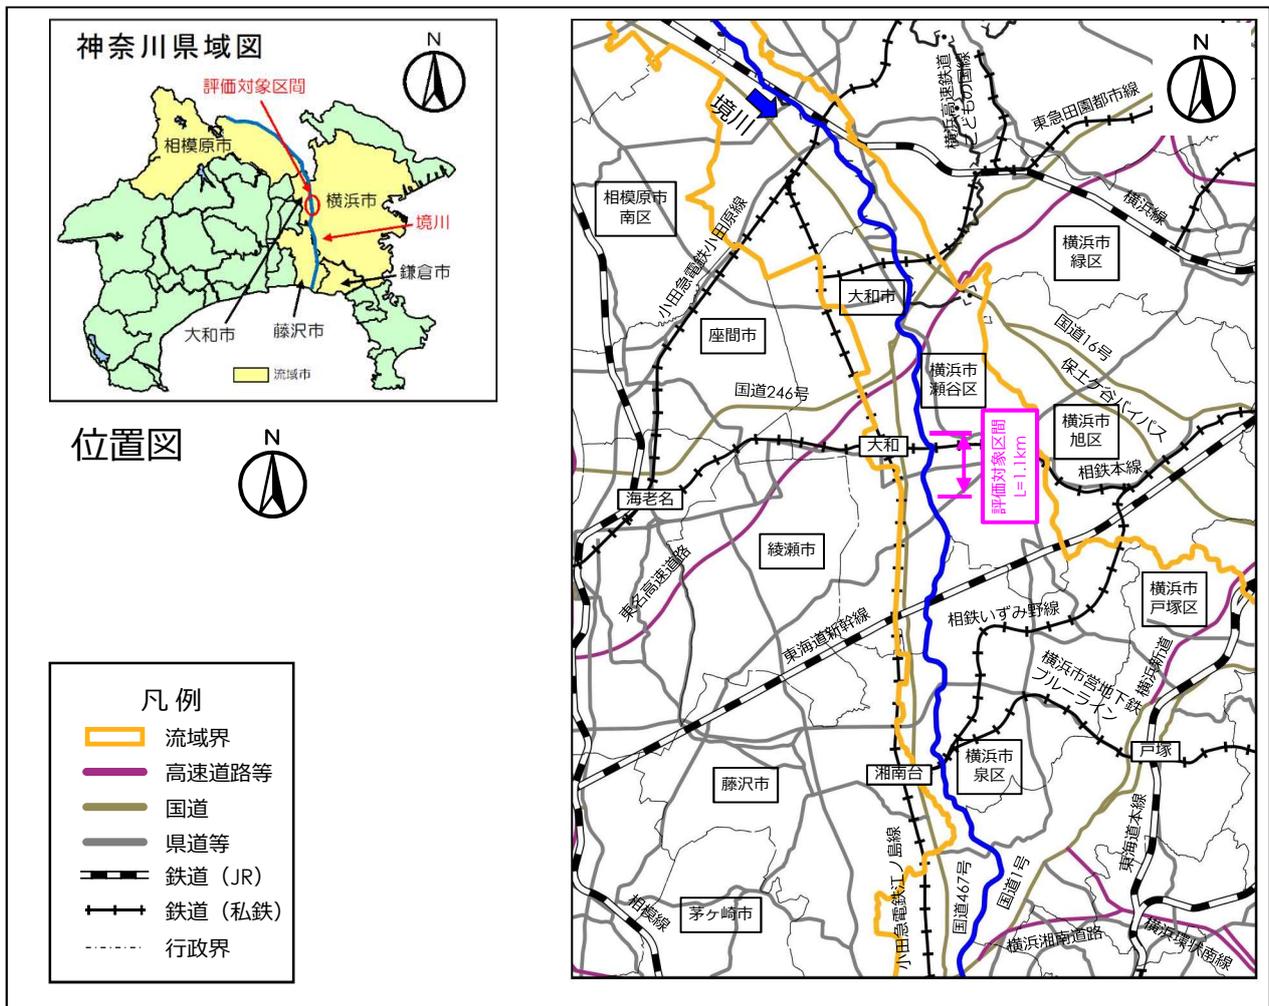

2) 評価対象事業の概要

- ・ 評価対象区間は、大和市水質管理センター付近の落差工から入村橋までの1.1km区間であり、時間雨量60mmの降雨に対応するよう、護岸整備及び橋梁架替を行う。
- ・ なお、境川は整備が必要な延長が長いため、本事業も含めて、川幅が特に狭い箇所などを優先的に整備をしている。

事業地周辺図

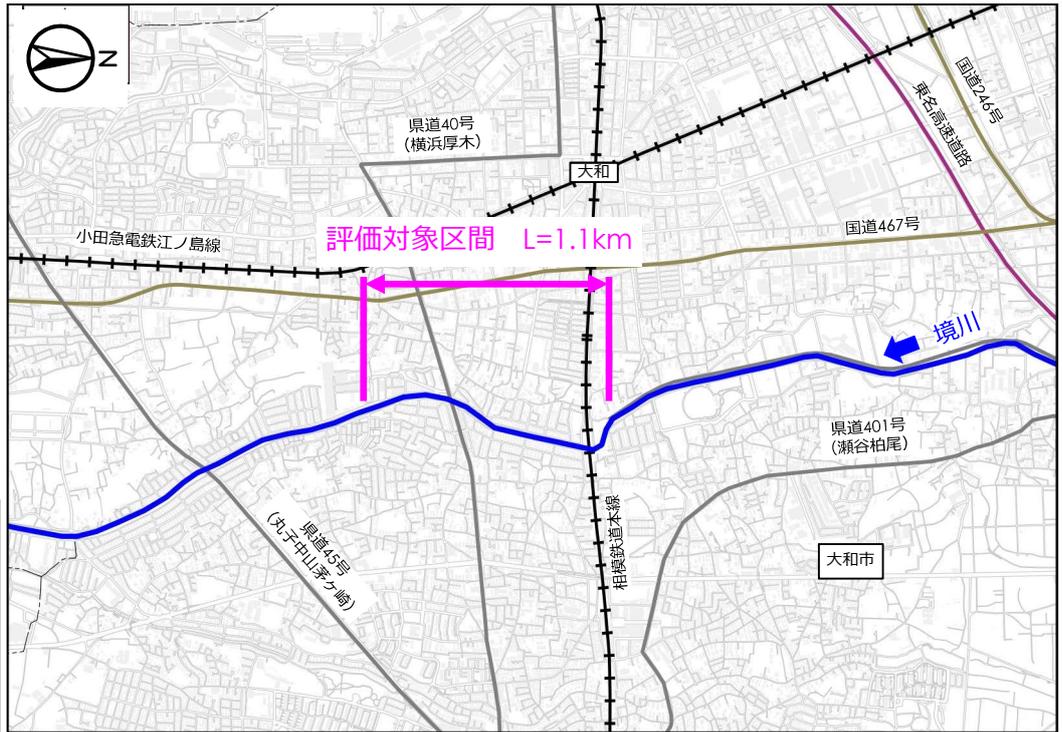

3) 評価対象事業の位置づけ

- ア) 法定計画：・境川水系河川整備計画（河川法）
- イ) 県の計画：・新かながわランドデザイン 実施計画  
「テーマⅣ プロジェクト12 危機管理 ～災害に強いかながわをめざして～」に位置づけ  
・かながわの川づくり計画  
「都市河川重点整備計画（新セイフティリバー）」対象河川に位置づけ
- ウ) 市の計画：・大和地域防災計画「第3編 風水害対策計画編 第1章 災害予防対策計画 第3節 水害予防対策」に位置づけ  
・横浜市防災計画「第2部 予防対策 第4章 風水害その他自然災害への備え 第1節 水害対策」に位置づけ
- エ) その他：・境川水系流域治水プロジェクトに位置づけ  
・神奈川県水防災戦略に位置づけ

都市河川重点整備計画（新セイフティリバー）対象河川



都市河川重点整備計画（新セイフティリバー）  
過去の大雨で水害が発生した河川や都市化の進展が著しい地域を流れる18河川について重点的に整備を進める。平成22年策定。

**境川**  
計画降雨強度 概ね60mm/hr  
年超過確率 1/10 ※

※年超過確率とは  
1年間に計画規模を超える降雨が1回以上発生する確率を意味しています。  
例えば、1/10とは、1年間にその規模（60mm/hr）を超える降雨が1回以上発生する確率が1/10（10%）であるという意味です。

## 2. 事業の経緯や必要性

### 1) 経緯

- ・ 昭和41年度 台風第4号による浸水被害発生（床上浸水4,972戸、床下浸水4,710戸）
- ・ 昭和48年度 集中豪雨による浸水被害発生（床上浸水2,636戸、床下浸水2,988戸）
- ・ 昭和49年度 台風第8号による浸水被害発生（床上浸水2,533戸、床下浸水1,585戸）
- ・ 昭和57年度 台風第18号による浸水被害発生（床上浸水1,577戸、床下浸水2,711戸）
- ・ 平成16年度 台風第22号による浸水被害発生（床上浸水252戸、床下浸水418戸）
- ・ 平成20年度 集中豪雨による浸水被害発生（床上浸水19戸、床下浸水74戸）
- ・ 平成27年度 河川整備計画の策定（計画降雨強度：50mm/hr⇒概ね60mm/hrにランクアップ）
- ・ 平成27年度 評価対象区間 事業着手
- ・ 令和元年度 評価対象区間 再評価実施

### 2) 必要性


- ア) 境川は流下能力が不足していることから、台風等の大雨で浸水被害が発生しており、付近では平成20年や平成26年に被害が生じていることから被害の軽減が必要である。また、毎年のように避難判断水位を超過していることから、改修の必要である。
- イ) 都市化の進展に伴い、川沿いまで人口や資産が集中していることから、被害の軽減を図る必要性が高い。

## 3. 事業の目的

- ・ 河川改修を推進し、都市の治水安全度の向上を図る。

## 4. 事業の内容

- 1) 事業区間 : 大和市水質管理センター付近落差工～入村橋
- 2) 事業延長 : 1.1km
- 3) 主な工種 : 護岸工、橋梁架替工
- 4) 計画降雨強度 : 概ね60mm/hr
- 5) 年超過確率 : 1/10
- 6) 計画高水流量 : 420m<sup>3</sup>/s

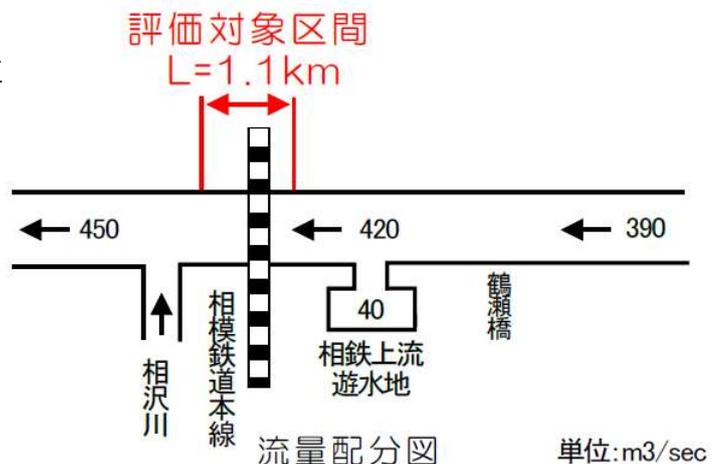


## 5. 事業実施にあたって配慮した項目


・ 本河川の川沿いは、周辺住民の生活道路として活用されている管理用通路を挟み、家屋が立ち並んでいる状況である。そのため、護岸工は、用地買収を伴わないように配慮し、鋼管杭を用いた直壁構造を採用した。また、鋼管護岸の施工の際には、自走式の回転圧入工法を採用することで、周辺住民の生活環境への影響を小さくするように配慮した。




平面図

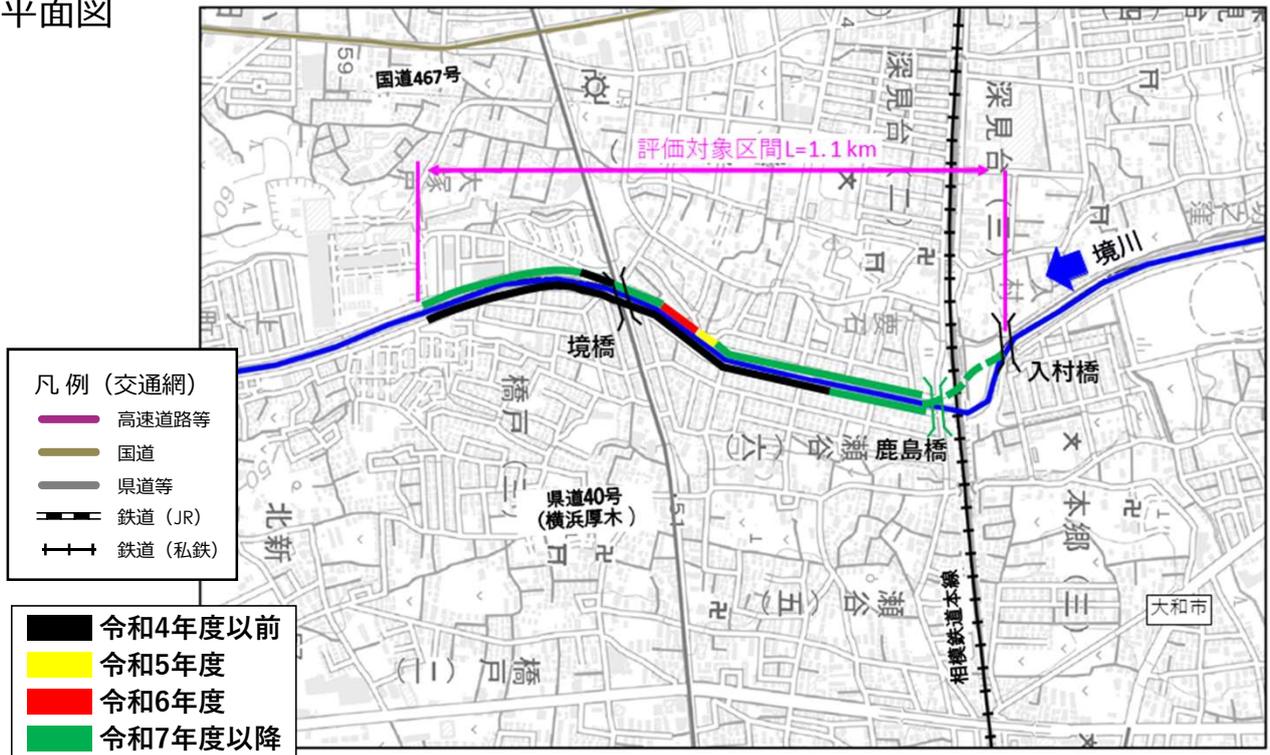

標準断面図

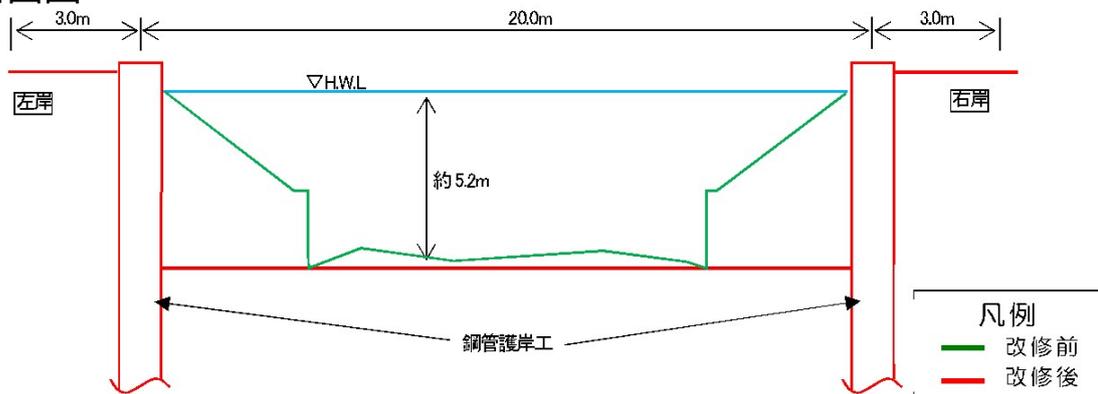

流下能力図

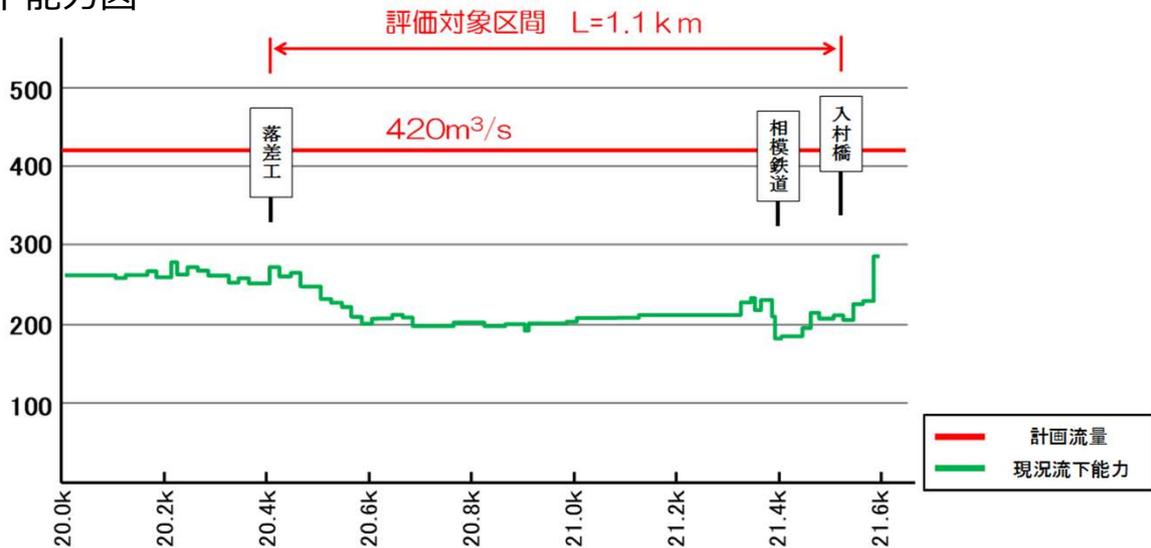

## ◆ 評価の視点

### 1. 事業の必要性に関する視点

#### 1) 事業を巡る社会経済情勢

##### ア) 地域の状況


- ・評価対象区間周辺にある、地域の重要な幹線道路である県道40号（横浜厚木）、大和市の避難所として指定されている深見小学校、光丘中学校等があり、浸水被害が生じると地域の交通機能や防災活動等に重大な影響を及ぼすことが懸念されることから、本事業の早期整備が強く望まれている。

##### イ) 地元の意向

- ・本河川が流れる大和市、横浜市は、地元住民の人命及び財産の保護のため、事業の早期完成を望んでいる。

##### ウ) 事業地の状況

- ・昭和51年度での市街化率は43%、令和3年度での市街化率は68%と、市街化率の上昇が見られ、境川水系周辺の市街化が進行している。

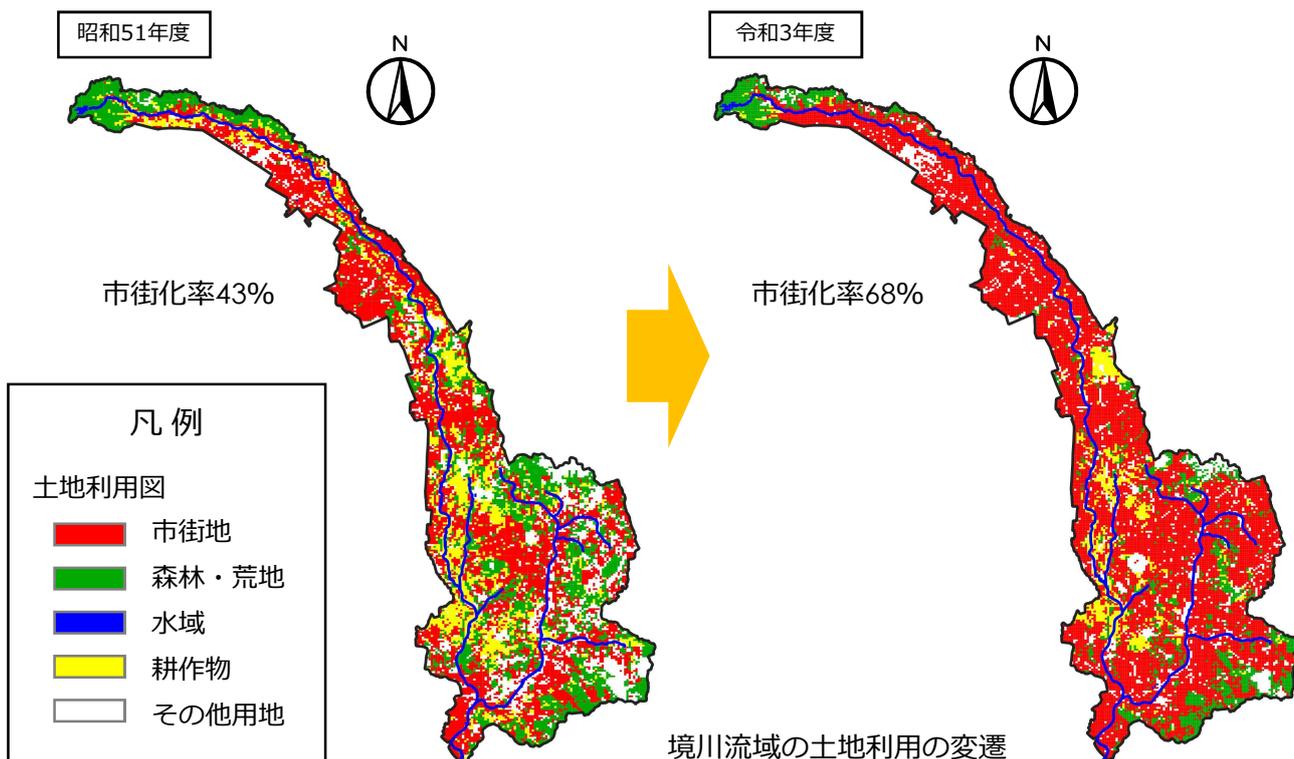



## 2) 事業の投資効果等（境川水系全体）

### ■ 浸水被害の軽減

- ・ 今回の対象区間を含む水系全体で、河川整備計画に基づく整備が完了した場合、整備計画の降雨強度（1/10）に対する現況（平成27年河川整備計画策定時点の評価）の浸水想定区域約310haが解消され、浸水被害の軽減が期待できる。

計画規模の降雨（年超過確率1/10）に伴う洪水が発生した場合の整備前後の浸水範囲

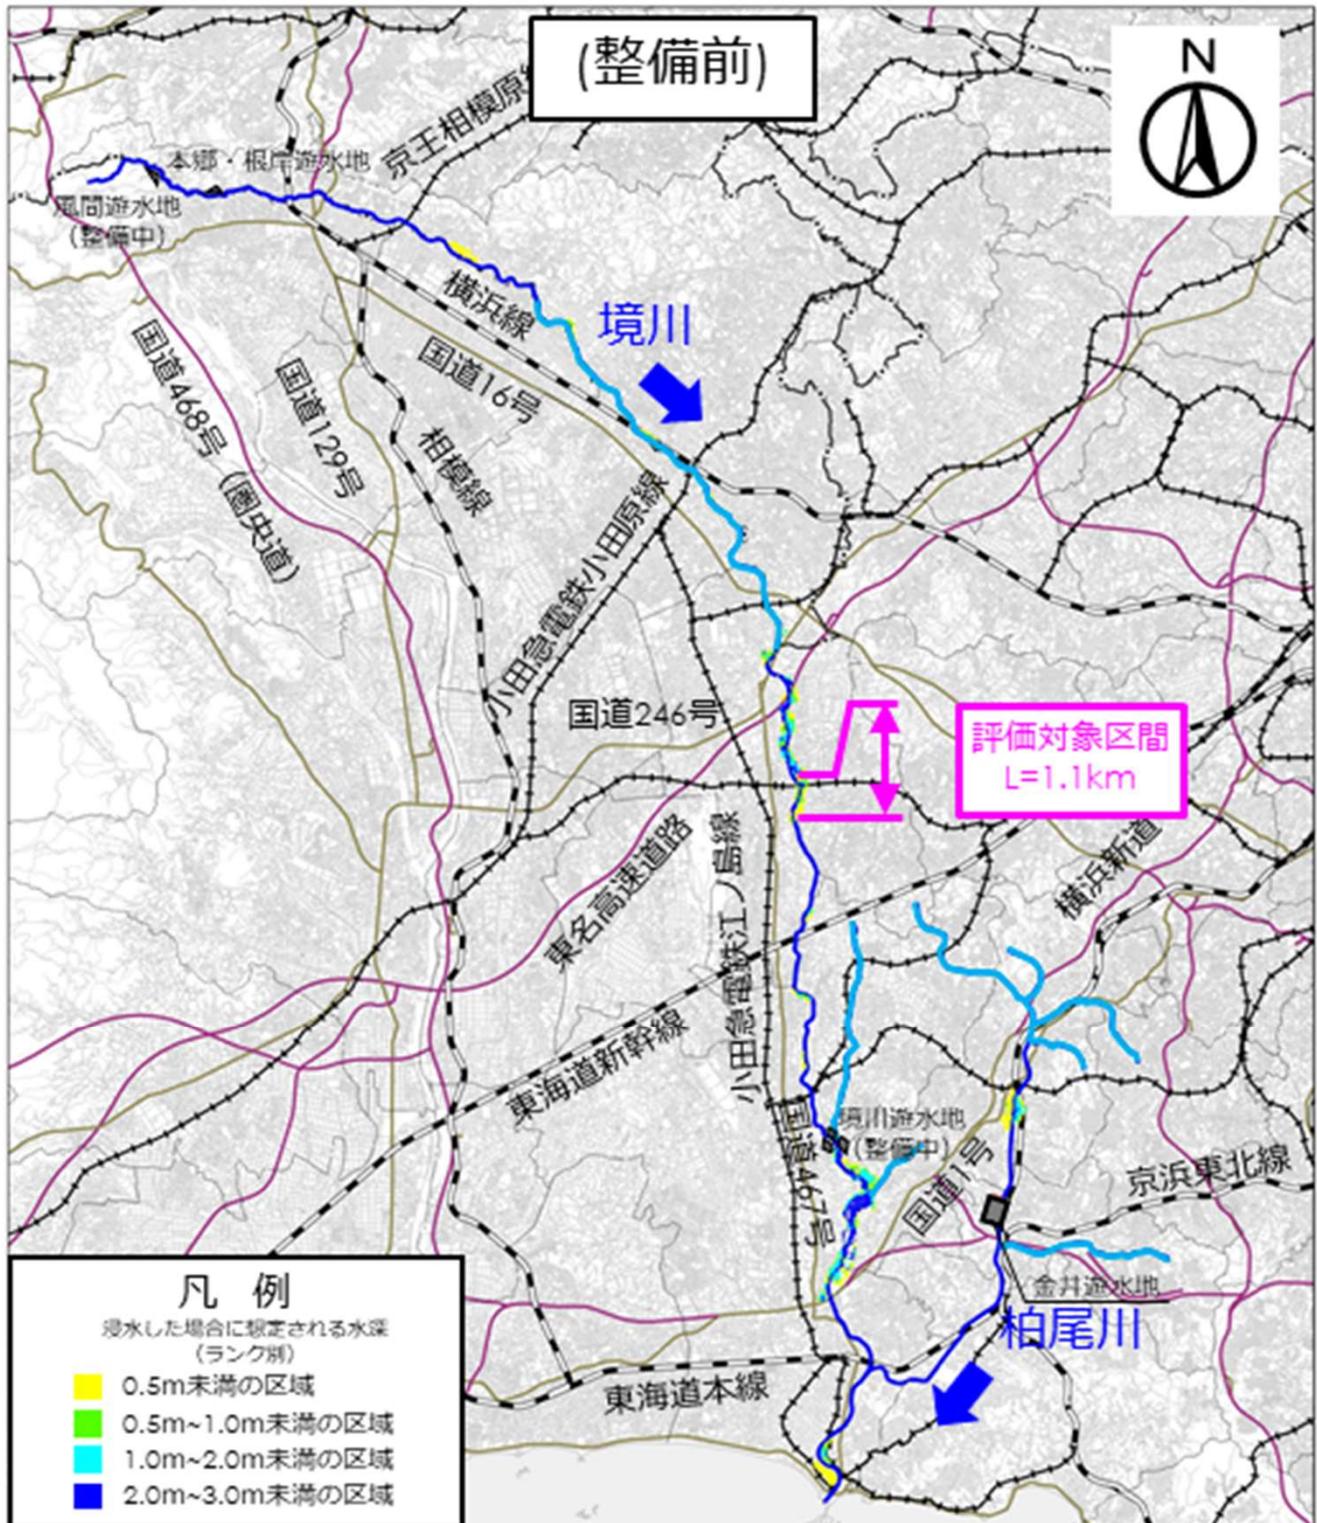

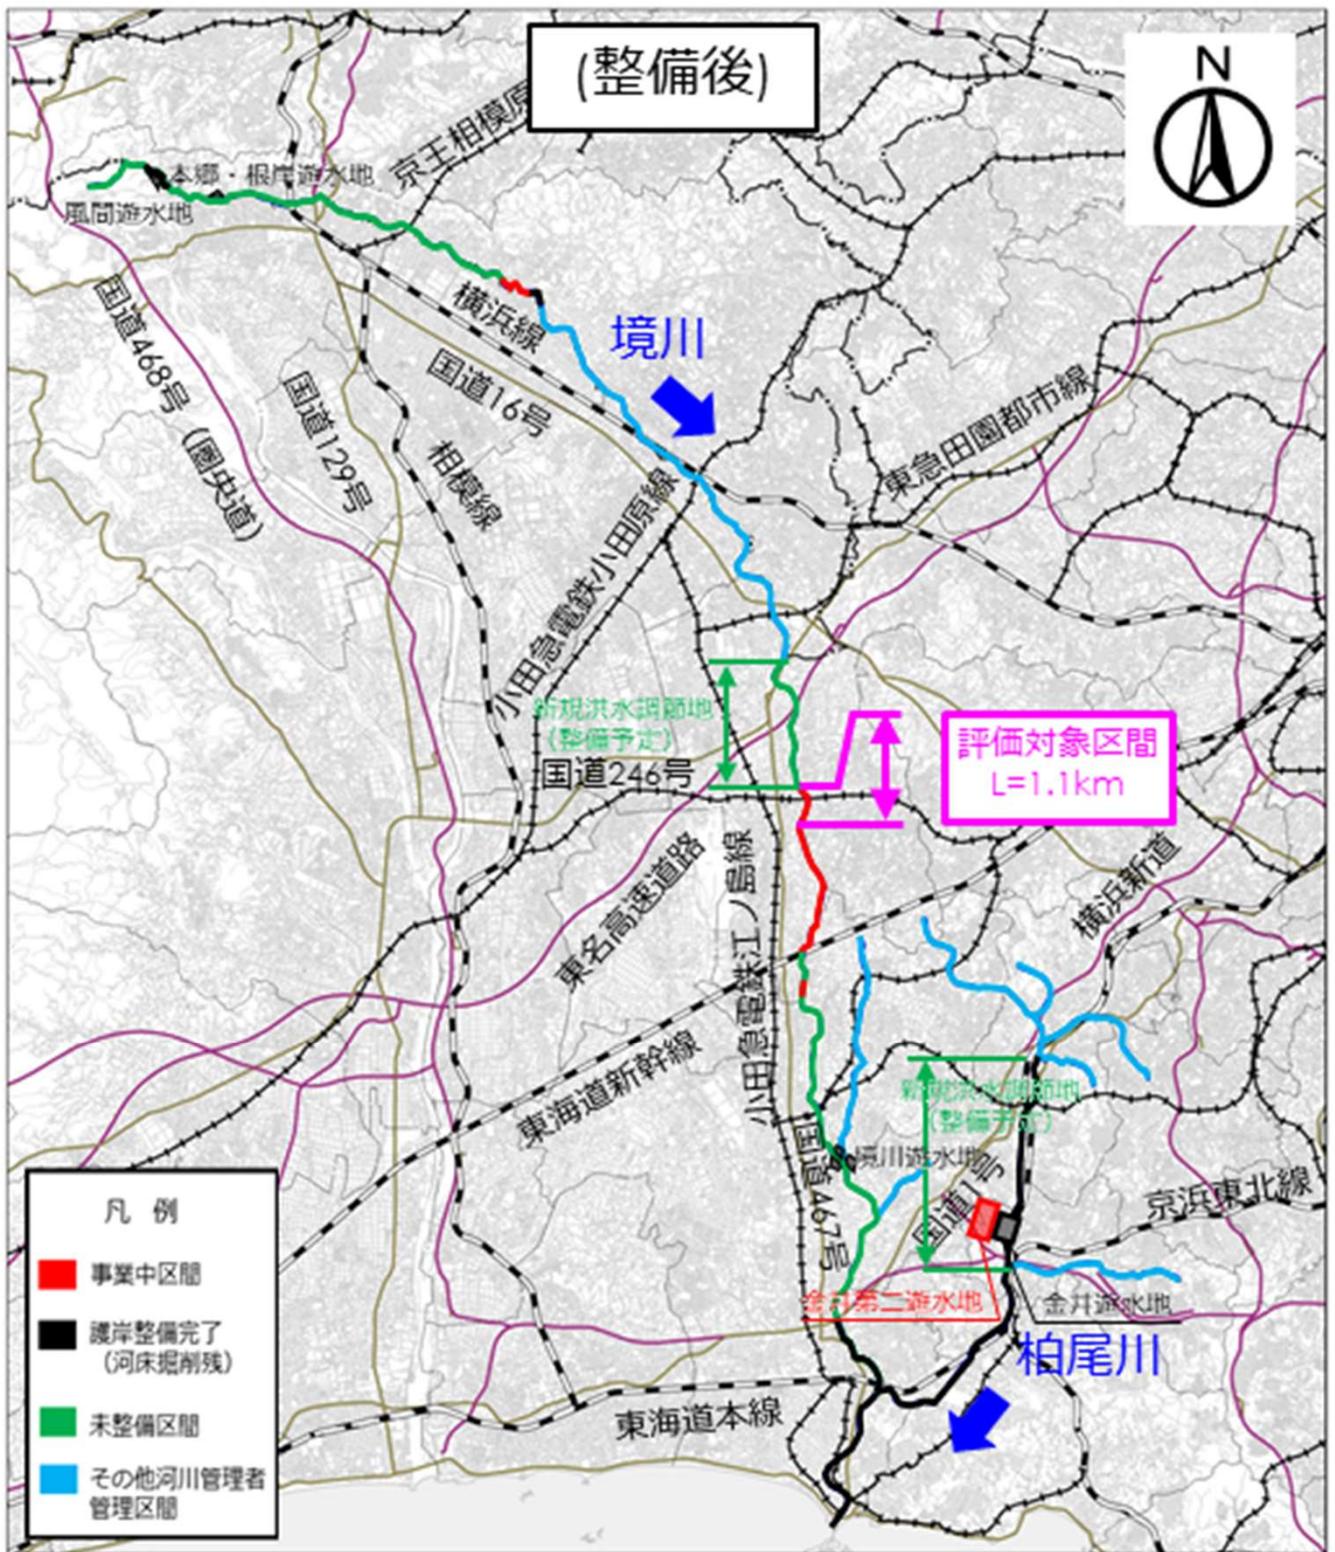

※B/C算定時の氾濫シミュレーションは、河川改修の事業効果を把握するために行ったものであり、洪水時の円滑かつ迅速な避難を確保すること等を目的とした水防法に基づく洪水浸水想定区域とは異なる。

B/C算定時の氾濫シミュレーション 評価対象区間の目標とする降雨 60mm/時間(年超過確率1/10)	水防法に基づく洪水浸水想定区域 想定最大規模降雨 632mm/24時間
---	---

※市町村は、県が作成した洪水浸水想定区域図を基に避難所等の情報を加えたハザードマップを作成・公表している。(https://disaportal.gsi.go.jp/ (国土交通省HP))

## ■費用対効果

		境川水系全体				※参考（評価対象区間）			
社会的割引率		4%の場合		1%の場合		4%の場合		1%の場合	
B/C		1.8		3.3		30.6		55.5	
経済的內部収益率（EIRR）		7.9%				131.7%			
総費用	事業費	1,268.6億円	1,136.7億円	1,807.9億円	1,452.0億円	101.3億円	91.7億円	104.1億円	86.3億円
	維持管理費		132.0億円				355.9億円		
総便益	被害防止便益	2,261.7億円	2,254.7億円	5,995.3億円	5,988.4億円	3,103.6億円	3,102.7億円	5,774.4億円	5,773.5億円
	残存価値		6.9億円		6.9億円		0.9億円		0.9億円

- ・評価対象区間の費用対効果の検討にあたっては、評価対象区間の整備効果を算出するために、対象区間の上下流は、河川整備計画に基づく整備が完了したという仮想条件のもと、評価対象区間の整備前後の浸水想定を比較し、被害防止便益を算出した。

## ■総合的な効果

### ア) 行政コストの削減

- ・水防団が出動する頻度が減少し、水防活動の実施に伴う行政コストの削減が期待できる。

### イ) 安全・安心・利便性

- ・評価対象区間において、計画の対象規模の降雨（年超過確率1/10）による洪水が発生した場合、浸水が想定される区域は約50ha、区域内人口は約3,700人、そのうち要配慮者数※<sup>1</sup>は約1,500人、家屋のコンセントが浸水すること等による停電の影響を受ける人口※<sup>2</sup>は約2,000人と推計されるが、こうした被害を軽減することができるため、本事業を実施することによって、地域住民の避難に要する負担が軽減される。計画規模を超える降雨の発生も想定されるが、浸水被害に対して相応の軽減効果が期待でき、住民の水害に対する不安も軽減される。

※1国勢調査の人口データを基に推計

- ・高齢者(65歳以上)
- ・自力避難が困難な妊婦
- ・乳幼児(7歳未満)
- ・障がい者

※2浸水想定範囲内の浸水深を基に推計

- ・浸水深70cm以上（コンセント浸水）：戸建て住宅及び集合住宅の1階が停電
- ・浸水深100cm以上（受変電設備浸水）：集合住宅の2階以上が停電

## 4) 関係する地方公共団体等の意見

### ア) 大和市および横浜市：

- ・本事業箇所周辺では、浸水被害が度々発生しており、地元住民から未改修箇所について事業完成による浸水被害の軽減が望まれている。

## 2. 事業の進捗の見込みの視点

### 1) 事業の進捗状況


	前回再評価時 (R1)	今回再評価時 (R6)	前回再評価時からの変化
事業化年度	平成27年度	平成27年度	-
用地着手年度	平成27年度	平成27年度	-
工事着手年度	平成27年度	平成27年度	-
進捗率	20%	56%	36%増
供用率	24%	50%	26%増 (護岸工を実施)
用地取得率	95%	95%	-
残事業の内容等	護岸工、橋梁架替工等	護岸工、橋梁架替工等	
完成年 (予定)	令和13年度	令和13年度	-
事業期間	17年間	17年間	-
事業費 (単純合計)	73.4億円	80.0億円	6.6億増 (9.0%増)
基準年	令和元年	令和6年	再評価時の年度
B/C	29.0	30.6	1.6増
総費用 (現在価値) 事業費 維持管理費	71.6億円 64.1億円 7.5億円	101.3億円 91.7億円 9.6億円	29.7億円増
総便益 被害防止便益 残存価値	2,075.2億円 2,074.3億円 0.9億円	3,103.6億円 3,102.7億円 0.9億円	1,028.4億円増

(変化した理由)

- ・ 基準年の見直し及び事業費の精査による総費用の増加
- ・ 費用便益分析マニュアルの改訂に伴う各種原単位の見直しによる便益の増加

### 2) これまでの課題に対する取り組み状況

- ・ 鉄道橋梁架替に必要な用地取得において、現在約9割の用地取得が完了している。残る用地について、交渉に難航している箇所もあるが、粘り強く交渉を進めながら、早期の取得を目指す。
- ・ 橋梁架替工の工法選定において、鉄道事業者と調整した結果、鉄道ダイヤや、既存施設の安全性に配慮した非開削工法 (PCR工法) を選定し、令和5年度に鉄道事業者との協定を締結した。引き続き鉄道事業者と連携しながら施工を行っていく。

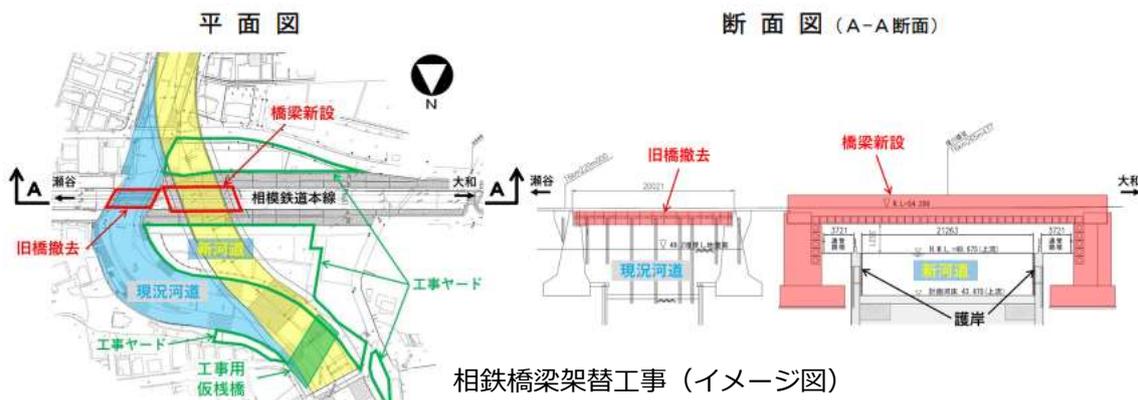

### 3) 今後のスケジュール

- ・引き続き事業を継続し、令和13年度の完成を目指す。

項目		年度	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
護岸工	前回									
	今回									
橋梁架替工	前回									
	今回									

### 3. コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点

#### 1) コスト縮減

- ・掘削の際には、既存の矢板護岸を仮設工として活用することで、コストの縮減を図った。

#### 2) 代替案立案等の検討

- ・用地取得が9割以上完了しており、代替案を検討し実行することは困難であることから、現行計画による整備が最善である。

### 現況写真



境橋下流部（未整備箇所：右岸）



境橋付近（整備中箇所）



相鉄線交差部（整備中箇所）

### ◆ 対応方針（案）

継続	<p>【理由】</p> <p>本事業は、河道の流下能力の不足から浸水被害が発生している中、河道改修を実施して、残区間の流下能力の向上を図るなどの必要性に変化はなく、重要性は現在も極めて高いことから、事業を継続する必要があると判断する。</p>
----	---
