


矢上川地下調節池トンネル本体 I 期工事 地表面変位測定結果のお知らせ

測定日：1月20日(火)

シールドマシン周辺の地表面変位測定の結果

●：地表面変位測定置

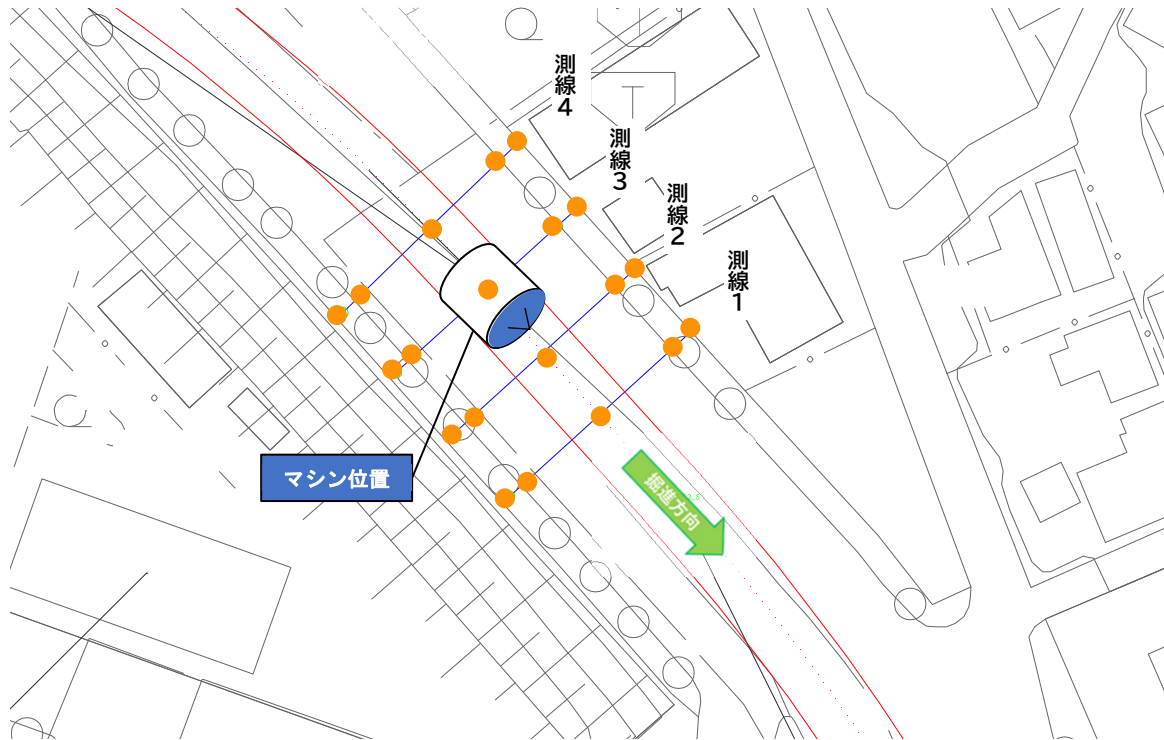

◆測定結果

測線	初期値 (m)	測定値 (m)	最大鉛直変位 (mm)
1	14.858	14.859	+ 1
2	15.134	15.133	- 1
3	14.868	14.866	- 2
4	14.932	14.930	- 2

※上表は、各測線のうち、鉛直変位の最大値を示しています。
