


矢上川地下調節池トンネル本体Ⅰ期工事 地表面変位測定結果のお知らせ

測定日：8月25日(火)

シールドマシン周辺の地表面変位測定の結果

●：地表面変位測定置

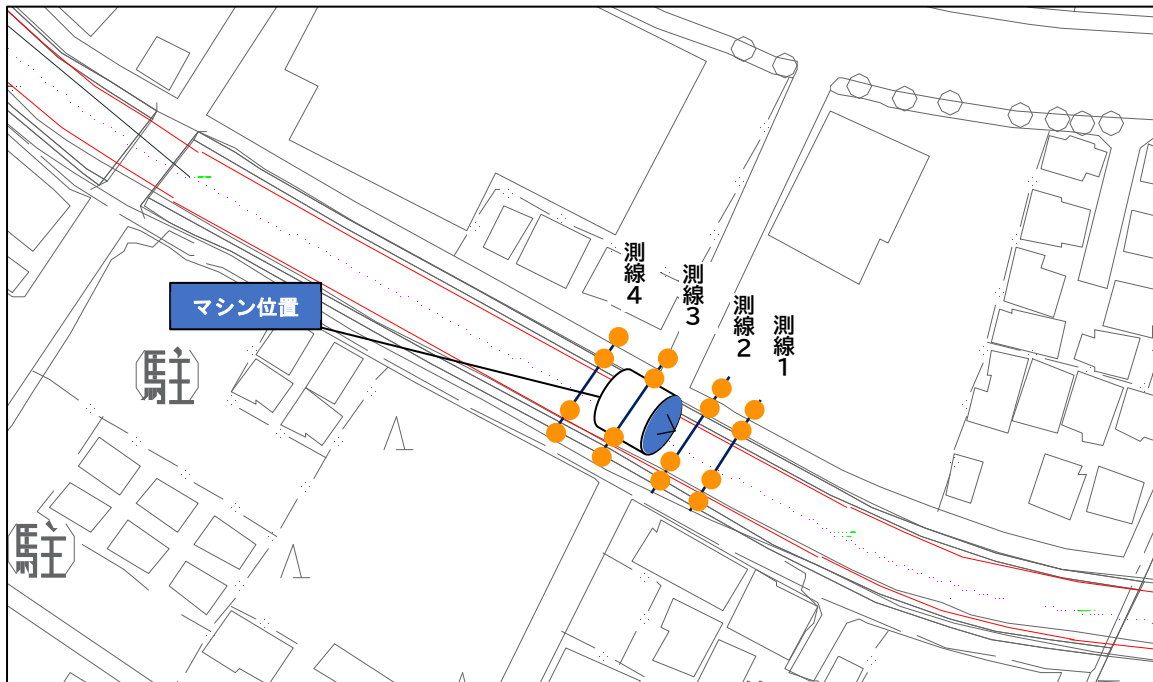

◆測定結果

測線	初期値 (m)	測定値 (m)	最大鉛直変位 (mm)
1	10.817	10.818	+ 1
2	10.827	10.826	- 1
3	10.854	10.856	+ 2
4	10.747	10.749	+ 2

※上表は、各測線のうち、鉛直変位の最大値を示しています。
