


矢上川地下調節池トンネル本体 I 期工事
地表面変位測定結果のお知らせ

測定日：7月21日(火)

シールドマシン周辺の地表面変位測定の結果

●：地表面変位測定置

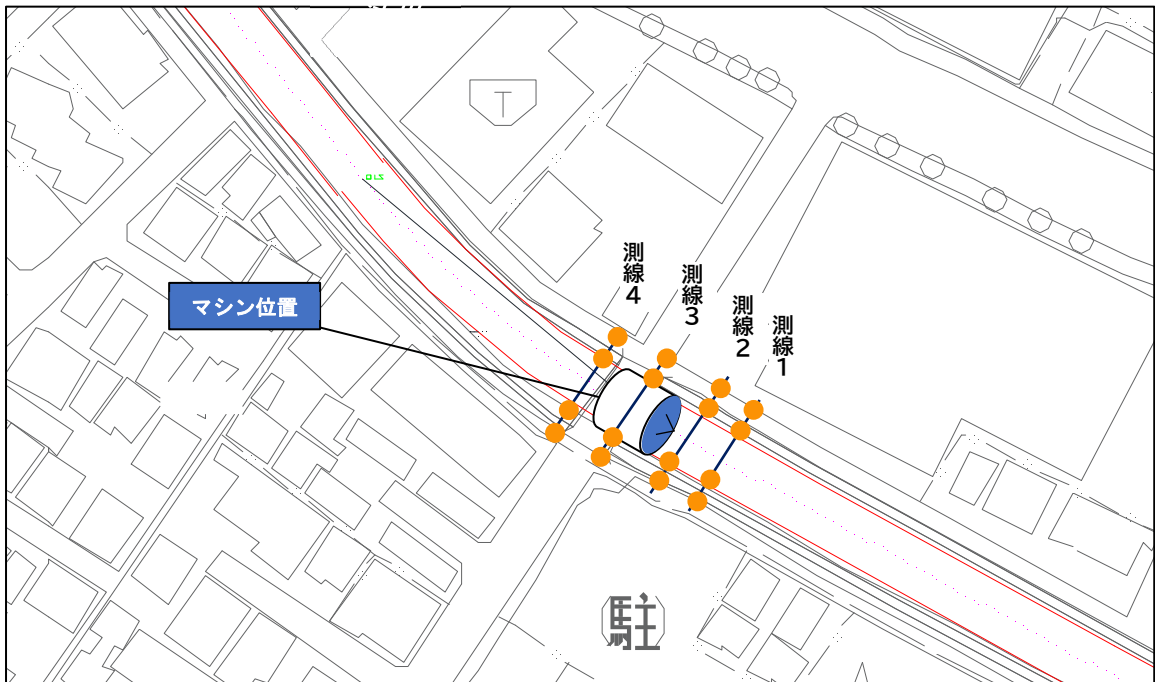

◆測定結果

測線	初期値 (m)	測定値 (m)	最大鉛直変位 (mm)
1	11.017	11.016	- 1
2	11.159	11.157	- 2
3	11.183	11.184	+ 1
4	11.084	11.083	- 1

※上表は、各測線のうち、鉛直変位の最大値を示しています。
