



## 二級河川葛川河川改修工事の進捗状況について(令和8年1月下旬時点)

令和7年度は、河床掘削工事の約0.3km区間のうち、新田橋付近の0.14kmを実施しています。

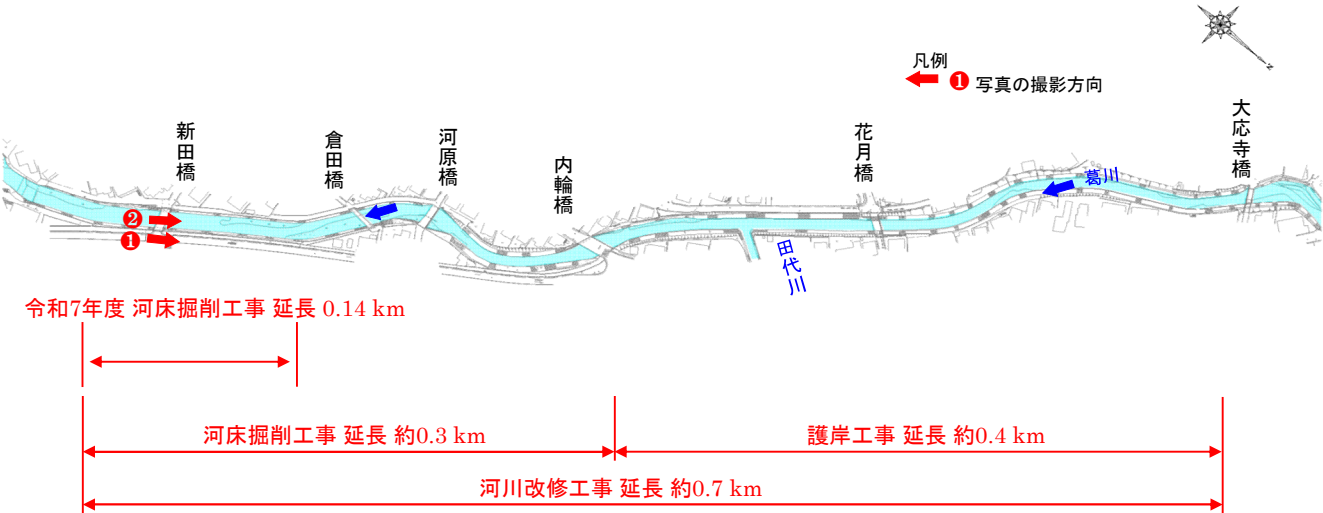

標準横断面図 (イメージ図)

河床掘削工事  
新田橋下流～内輪橋 約0.3km

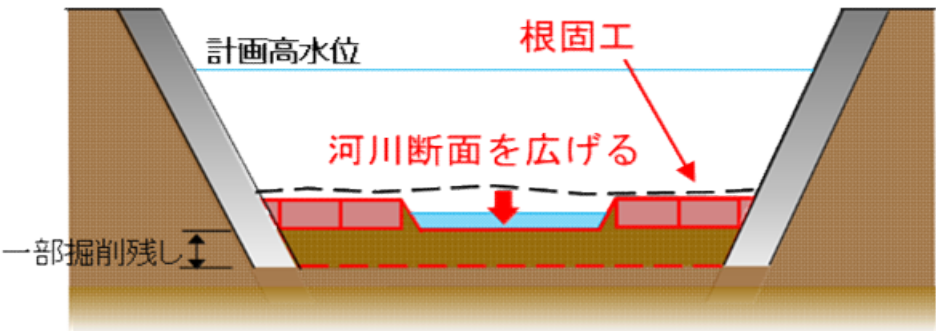

### 工事の進め方

- ① 左岸側から根固工を施工します。
- ② 左岸側の根固工が完了した後、右岸側の根固工を施工します。
- ③ 兩岸の根固工が完了した後、川の中央部を掘削して、本工事は完成となります。

下の写真は、これまでの施工状況です。



①の写真は、根固工の施工のために河床を掘り下げている様子です。



②の写真は、右岸側の根固工の施工状況で、かごマットという鋼製のかごに割栗石を敷詰めている様子です。

※ 現在は、右岸側の根固工を施工しており、設置完了後川の中央部の掘削を行います。
