

東丹沢：平成 31 年 4 月 21 日

半原越—仏果山

＜「登山道補修隊」の活動を行いました＞

- 神奈川県自然公園指導員 12 名とパークレンジャー等スタッフ 3 名の計 15 名で、登山道の補修作業を行いました。
- 半原越から仏果山に向かう登山道には、丸太階段の急登が何か所かあります。古くなった階段が壊れて脇を歩く登山者が多くなると、登山道の幅が必要以上に広がってしまい、植生への悪影響が懸念されます。今回の補修では、このような壊れた丸太階段を修復して歩きやすくしました。


古くなって壊れた丸太階段



- 集合場所の土山峠で本日の作業内容を説明したあと、まずは準備体操です。



- 稜線まで登り、あらかじめ準備しておいた丸太を作業場所まで運びます。
丸太を2本背負うと相当な重さとなり、つらい登りが続きます。
※今回使った丸太は間伐材で、森林所有者の許可を得ています。

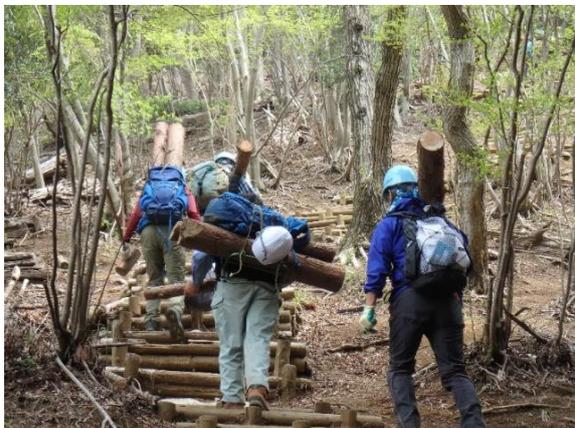

- 参加者は3班に分かれて活動しました。それぞれの班はどこをどのように補修すれば歩きやすくなるのか、事前にしっかり確認してから作業に入ります。



- 古い鉄の杭を再利用して丸太を固定します。



- 丸太は木の根にからませることで、より強く固定できます。
また、ハードル化を防ぐために丸太の周りに石を詰め込みます。



- 無事作業が終わり季節の花を楽しみながら土山峠へ下山しました。
ミツバツツジが見頃を迎え、ヤマツツジも咲き始めていました。

